

## 5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Desde inicios del periodo de gestión se identificó debilidades en infraestructura y dotación de lo cual se derivan bajos niveles de oferta de servicios de salud, limitando el acceso de los usuarios a los servicios de salud de primer nivel de complejidad, además de afectar la calidad en los mismos.

### 5.1. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN VICENTE

INFORMACIÓN GENERAL	
MUNICIPIO	Municipio de Pasto
NIT MUNICIPIO	8912800003
ENTIDAD PROPONENTE	Pasto Salud ESE
NIT ENTIDAD PROPONENTE	900091143-9
DEL PROYECTO	
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción y Dotación del Centro de Salud San Vicente de Pasto Salud ESE en el municipio de Pasto.
<b>VALOR TOTAL DE INVERSIONES</b>	<b>\$8.936.061.290,73</b>
GASTOS PREOPERATIVOS	\$120.000.000,00
TERRENOS	\$500.000.000,00
<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	<b>\$8.316.061.290,73</b>
<b>COMPONENTE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>\$6.687.094.796,63</b>
OBRA INFRAESTRUCTURA	\$ 6.249.621.305,26
COSTO DIRECTO DE OBRA	\$4.807.401.004,04
AUI – OBRA	\$1.442.220.301,21
INTERVENTORÍA INFRAESTRUCTURA	\$ 437.473.491,37
<b>COMPONENTE DOTACIÓN</b>	<b>\$1.628.966.494,00</b>
DOTACIÓN	\$1.628.966.494,00
<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>\$8.936.061.290,73</b>

NACIÓN (MIN SALUD)	\$0
DEPARTAMENTO	\$0
MUNICIPIO	\$0
ESE O IPS (PASTO SALUD ESE)	\$620.000.000,00
REGALÍAS	\$0
OTROS	\$8.316.061.290,73
PROBLEMA A RESOLVER	Bajos niveles de acceso y seguridad en los servicios de salud del primer nivel de complejidad del Centro de Salud San Vicente, de la Comuna ocho (8) del Municipio de Pasto.
OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO	Mejorar el acceso y seguridad en los servicios de salud del primer nivel de complejidad del Centro de Salud San Vicente, de la comuna ocho (8) del Municipio de Pasto.
POBLACIÓN BENEFICIARIA	14.207 Usuarios de la comuna 8 del Municipio de Pasto, registrados en el Centro de Salud San Vicente.
USUARIOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	0
USUARIOS RÉGIMEN SUBSIDIADO	14.207 Usuarios (90% Emssanar, 10% Otras)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Municipio de Pasto, Comuna 8, Barrio San Vicente Calle 7 No. 35-09



**Convenio de cofinanciación:**

Se suscribió entre el Municipio de Pasto y Pasto Salud ESE, el convenio No. 152163 del 3 de Junio de 2015, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos para el uso adecuado de los recursos de saldos de cuentas maestras conforme a lo dispuesto en la Ley 1608 de 2013, para la cofinanciación del proyecto CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN VICENTE". El valor del convenio es de SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$7.211.791.522,92).

**RESUMEN PROYECTO CONSTRUCCION Y DOTACIÓN CENTRO DE SALUD SAN VICENTE**

- Se suscribe Convenio N° 152163 DEL 3 DE JUNIO DE 2015 MUNICIPIO DE PASTO -PASTO SALUD E.S.E. por \$ 7.211.791.522,92; para adelantar la construcción del proyecto como se relaciona a continuación:

CDP	FECHA	CONCEPTO	RUBRO	VALOR
365	03 Dic. / 15	Construcción y dotación Centro de Salud San Vicente	23101 Infraestructura propia del sector	\$6.774.318.032
370	14 Dic. /15	Interventoría Centro de Salud San Vicente	23101 Infraestructura propia del Sector	\$437.473.491
			<b>Sumatoria</b>	<b>7.211.791.522.92</b>

- El 17 de febrero de 2016 se publicó la Licitación Pública LP 001-2016 en la página Web institucional y en la página de SECOP en la cual se publico el aviso, el documento de estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones, y sus respectivos anexos.

**Estado del proyecto a la fecha**

- El 12 de mayo de 2016 se realiza comité de contratación para la audiencia de adjudicación de obra, y los miembros del comité de contratación recomiendan al gerente otorgar al Consorcio San Vicente 2016 la construcción y dotación del centro de salud de san Vicente, por un valor de \$ 6.774.317.837,26; discriminado en:


PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE SALUD SAN VICENTE	
ADJUDICADO A:	CONSORCIO SAN VICENTE 2016
VALOR TOTAL:	6.774.317.837,26
INFRAESTRUCTURA:	6.249.621.305,26
DOTACION	524.696.532,00

- Se suscribe contrato 118/2016 el 8 de junio de 2016 y se firma acta de inicio el 29 de junio de 2016, con duración de 10 meses, hasta el 29 de abril de 2017.
- El proceso se encuentra en cuatro sí; Carpeta No. 1: 149 folios y dos cd, carpeta No. 2, 170 folios y 1 cd; Carpeta No. 3, 95 folios y carpetas No. 4 41 folios, contentivas del proceso de contratación y actas del comité de contratación en la oficina de Planeación.

### CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA INTERVENTORÍA

- El día 27 de abril de 2016 fue publicada la Resolución No. 0152 del 27 de abril de 2016, mediante la cual se ordenó la apertura del CONCURSO DE MÉRITOS CM-2016-001 para contratar LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DEL CENTRO DE SALUD SAN VICENTE así como el pliego definitivo de condiciones del proceso.
- El 2 de mayo de 2016, se realizó la audiencia pública de aclaración de pliegos y asignación de riesgos. El cierre del concurso de méritos, la recepción de ofertas y apertura de propuestas fue el 16 de mayo de acuerdo al cronograma.
- El 8 de junio de 2016 se adjudica el CONCURSO DE MÉRITOS CM-2016-001 al Consorcio Consalud por valor de \$ 437.473.491. El 15 de junio de 2016 se suscribe contrato de interventoría.
- Se firma acta de inicio el día 28 de junio de 2016, con fecha de terminación para el 13 de julio de 2017. Se realizó entrega del lote al contratista; se elaboraron actas de vecindad de las viviendas colindantes al proyecto; se ubica valla, se da inicio a demolición de estructuras existentes y desalojo de escombros en el lote del proyecto; replanteo del proyecto y cierre del lote.

**5.2. PROYECTO: AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL LOCAL CIVIL**

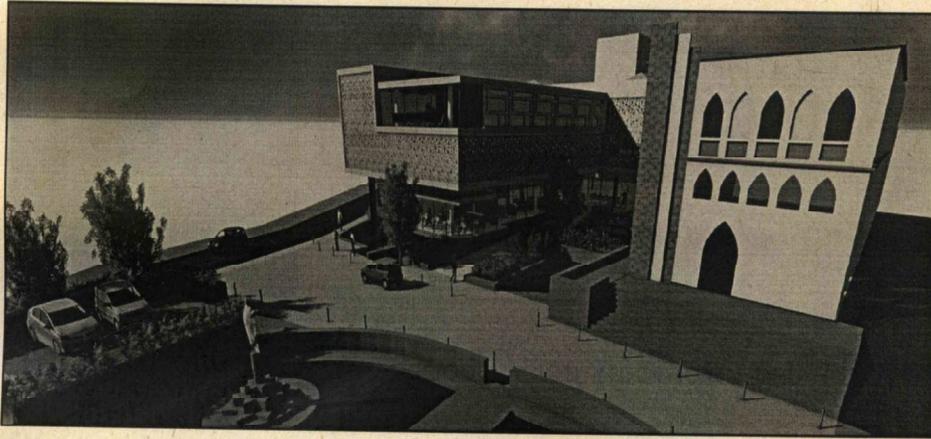

***Gestiones y aprobaciones del proyecto:***

Este proyecto cuenta previamente con: Diseños Hidrosanitarios aprobados por EMPOPASTO SA ESP según comunicado 20143300155771 del 26 de noviembre de 2014, diseños Eléctricos aprobados por Cedener SA EPS según comunicado del 20 de agosto de 2014, Licencia de construcción No. 52002-2-LC-14-0553 del 20 de mayo de 2015.

El 28 de diciembre de 2015, el proyecto obtuvo concepto de viabilidad del IDSN, se recomienda gestionar los recursos para presentarlo ante al Ministerio de la Protección Social, ya que no se puede presentar si no se tiene la disponibilidad y/o cofinanciación de los recursos.
