ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		PRELIMINARES.					FECHA:
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M					
	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2M		19,5			ml	19,5	FC
OBSERVACIONES: CERRAMIETO PROVISONALPARA LA EJECUCION DE OBRA AL PERIMETRO DE EL PUESTO DE SALUD.							
					TOTAL:	19,50	

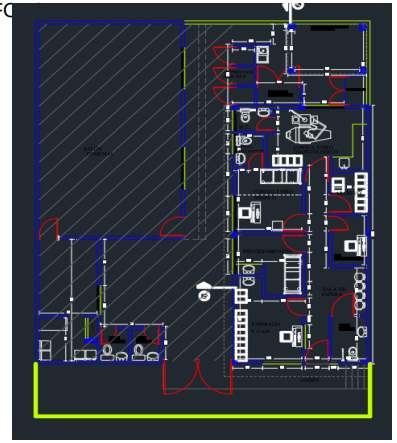

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE EN ASBESTO CEMENTO					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
CUBIERTA PUESTO DE SALUD	1	12,9	5,95		m2	76,8	

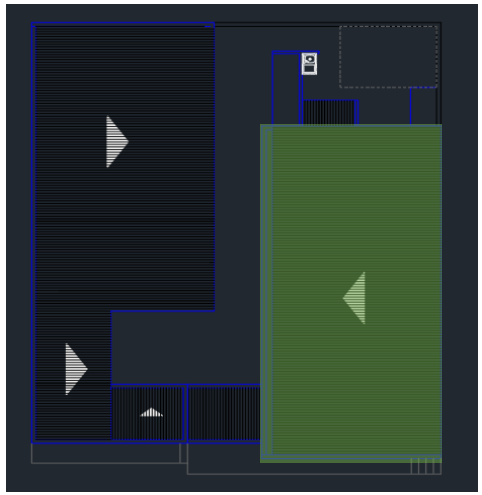

OBSERVACIONES: El puesto de salud exhibe una cubierta compuesta de asbesto cemento, cuya presencia conlleva riesgos significativos para la salud. Se observa que esta cubierta presenta notables deterioros, lo cual amplifica los peligros asociados con la exposición al asbesto.

TOTAL:	76,76	

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES					FECHA:
ITEM							DESCRIPCION
UNIDAD	m2	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO FORMATO 30X30 CERAMICA					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
ENCHAPE PISO ODONTOLOGIA	1	4,8	2,9		m2	13,92

ESQUEMA

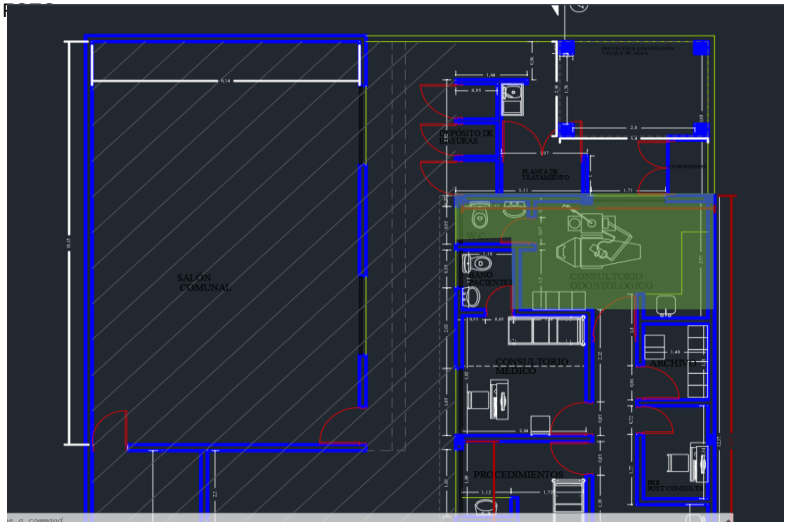

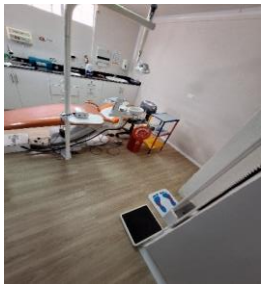

OBSERVACIONES:LA CERAMICA DEL PISO MUESTRA SIGNOS DE DETERIORO, CON DESGASTE APARENTE. SE REALIZARÁN EXCAVACIONES PARA INSTALAR NUEVAS TUBERÍAS TANTO SANITARIAS COMO DE AGUA POTABLE.

TOTAL: 13,92

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	DEMOLICIÓN DE REPELLO DE PISO Y PARED E=3 CM					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
demolicion repello piso ODONTOLOGIA		4,80	2,9		m2	13,92

ESQUEMA

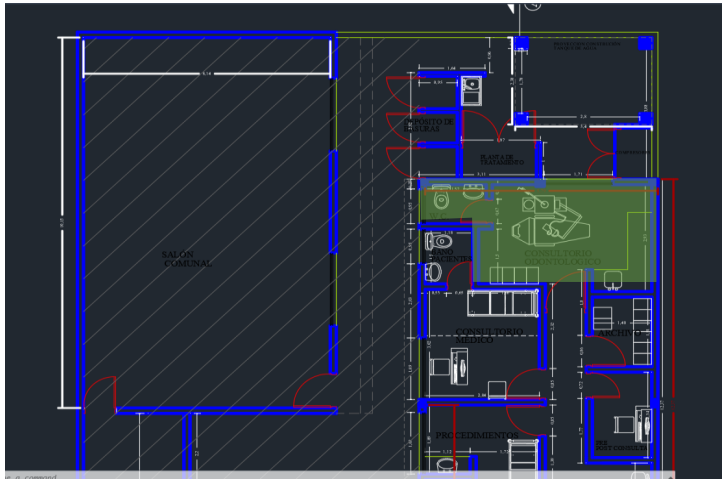



OBSERVACIONES: REPELLO EN ALTO GRADO DE DETERIORO POR CAUSA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS , ALTO GRADO DE HUMEDAD HONGOS.

TOTAL: 13,92

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	M3	RETIRO Y DESALOJO DE ESCOMBROS HASTA LUGAR DE DISPOSICION FINAL					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	AREA	ANCHO	ALTO		
DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISO FORMATO 30X30		13,92		0,15	M3	2,09
DEMOLICIÓN DE REPELLO DE PISO Y PARED E=3 CM		13,92		0,15	M3	2,09
RETIRO DE CUBIERTA EXISTENTE		76,76		0,15	M3	11,51
DESMOMNTE DE CIELO RASO		40,00		0,08	M3	3,20

ESQUEMA

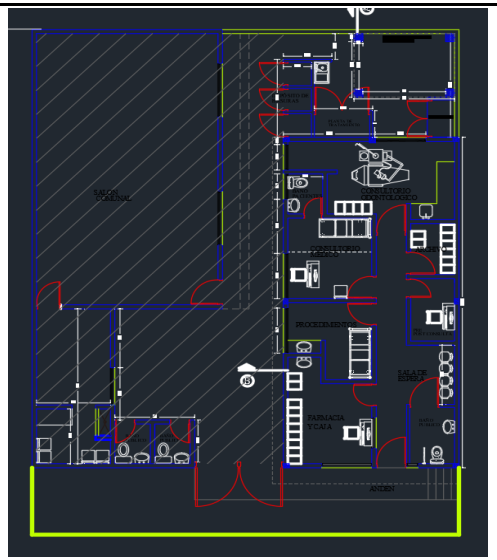

OBSERVACIONES: El RETIRO DE ESCOBRO SE DEBE EJECUTAR EVACUANDO HASTA EL ACCESO PRINCIPAL POR MEDIO CARRETEABLE, Y DESDE AHÍ HACER EL ESPACIO PARA EVACUAR EN VOLQUETA.

TOTAL: 18,90

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	DESMONTE DE CIELO RASO					
	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
CIELO RASO PUESTO DE SALUD	1	8	5		M2	40,00	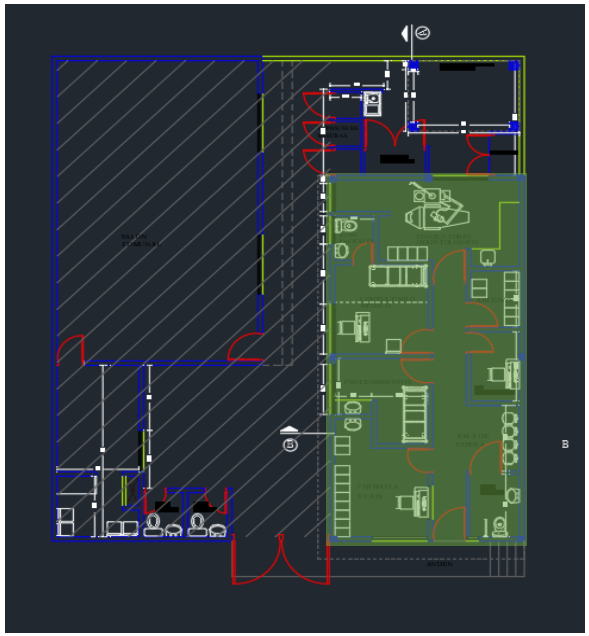

OBSERVACIONES: LA REMOCIÓN DEL CIELO RASO SE JUSTIFICA POR LA NECESIDAD DE EFECTUAR UN CAMBIO EN LA CUBIERTA.

TOTAL:	40,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		RETIRO DE CUBIERTA Y DEMOLICIONES				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm PUESTO DE SALUD.		65			ML	65	PLANO

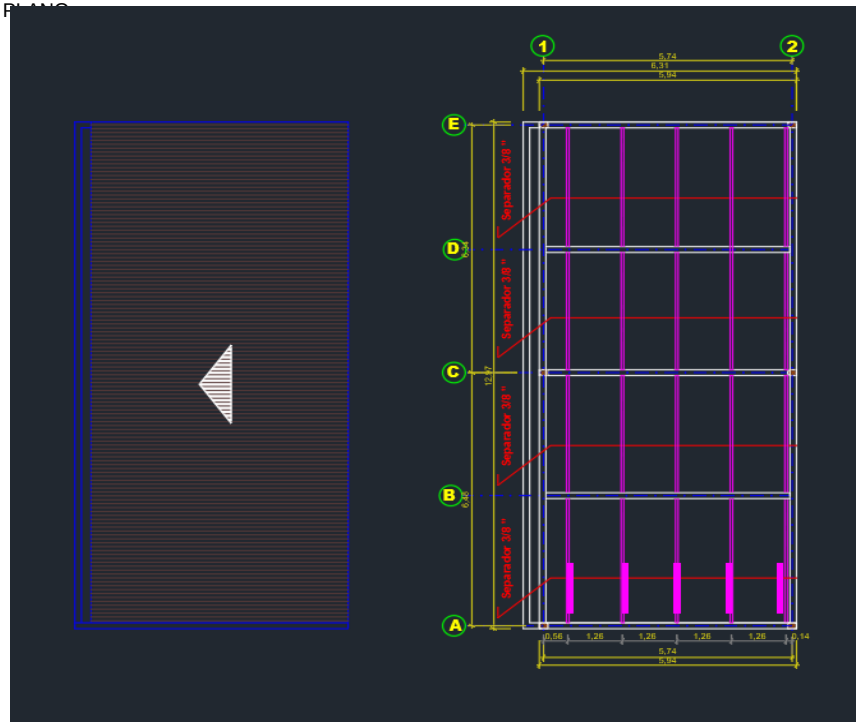

OBSERVACIONES Distribucion de correas de acuerdo a Detalle TIPO para cubiertas de puestos de salud, según concepto tecnico de ingeniero estructural.

TOTAL: 65,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CONCRETOS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	M3	RECALCE VIGA CORONA DE 15X20 EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 (3000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
Recalse de viga corona para anclaje de perfilesinstalacion de cubierta. Puesto salud y cocina	1	30	0,2	0,15	M3	0,90	PLANO

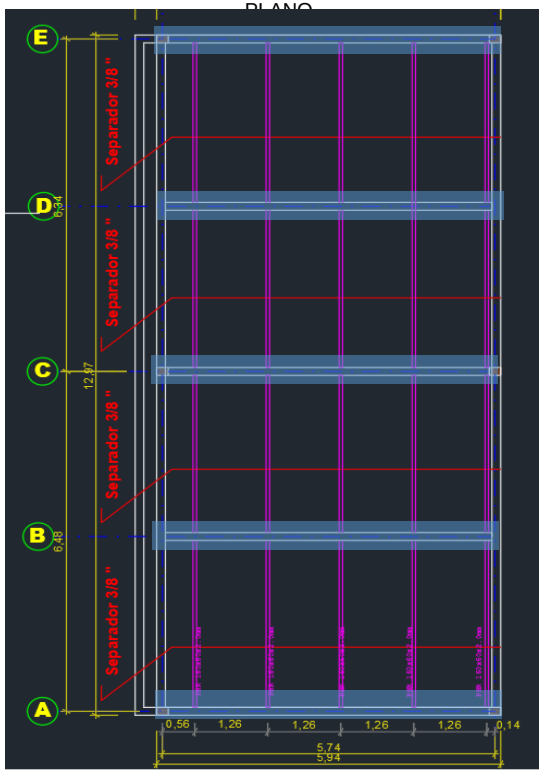

OBSERVACIONES: Dada la considerable degradación de la cubierta debido a su estado deficiente, es necesario reconstruir la viga de corona existente para proporcionar estabilidad y firmeza, lo que fortalecerá la resistencia de la estructura al momento de realizar las mejoras en la cubierta. Además, las modificaciones se concentrarán exclusivamente en la sección central del puesto de salud, así como en el edificio que alberga la bodega y la cocina.

TOTAL:	0,90

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CONCRETOS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	KG	ACERO DE REFUERZO 4200 KG/CM2 (6000PSI)					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	DIAMETRO	PESO		
ACERO PARA RECLACE DE VIGA CORONA COCINA, PARTE CENTRAL PUESTO DE SALUD	REFUERZO 1	4	30	# 4	0,99	118,80	
	REFUERZO 2	300	0,66	# 3	0,56	110,88	

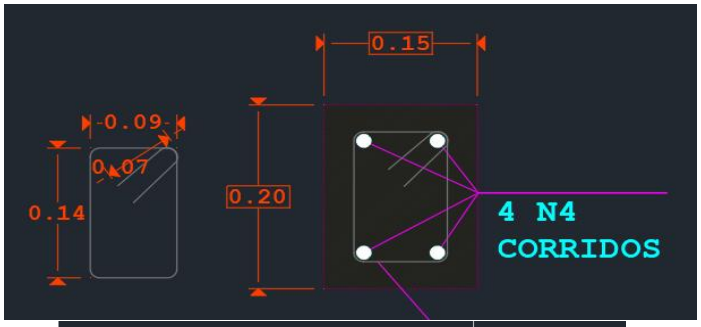

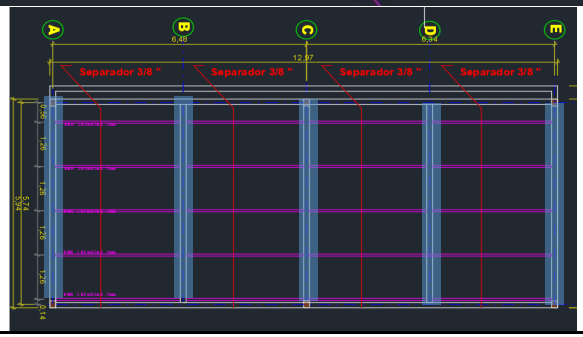

OBSERVACIONES:

TOTAL: 229,68

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CUBIERTAS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm.					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
SUMINISTRO E INSTALACION Correa en perfil PHRC de 160x60x2,00 mm PUESTO DE SALUD.		65			ML	65

ESQUEMA

PLANO

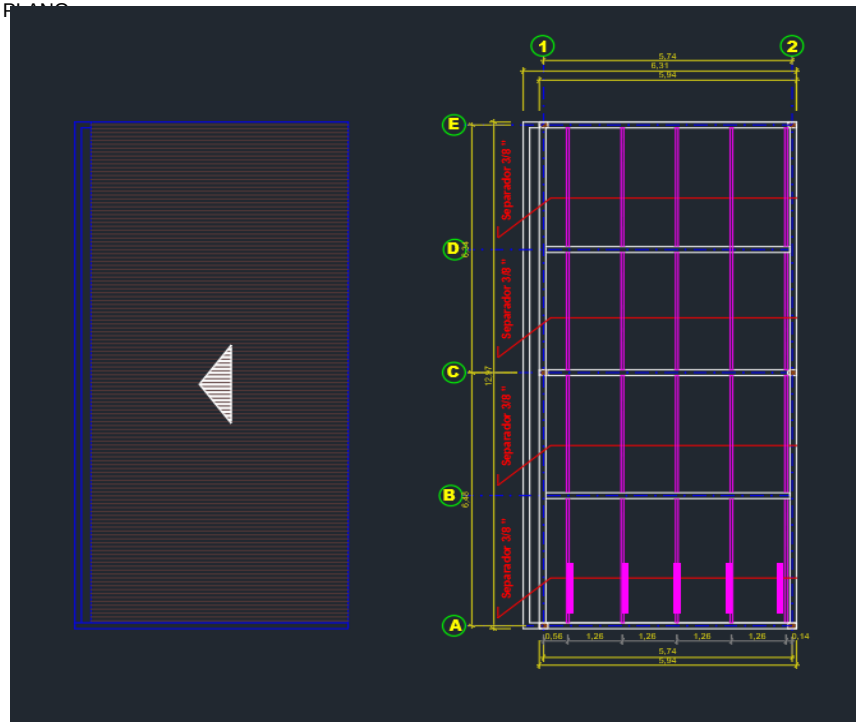

OBSERVACIONES Distribucion de correas de acuerdo a Detalle TIPO para cubiertas de puestos de salud, según concepto tecnico de ingeniero estructural.

TOTAL: 65,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO						MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CUBIERTAS			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	m2	SUMINISTRO E INSTALACION Cubierta trapezoidal en teja termoacustica UPVC E=2.3 MM Ecoroof 37 mate cresta alta (incluye tornillos autoperforantes,				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
CUBIERTA PUESTO DE SALUD	1	12,9	5,95		M2	76,755

ESQUEMA

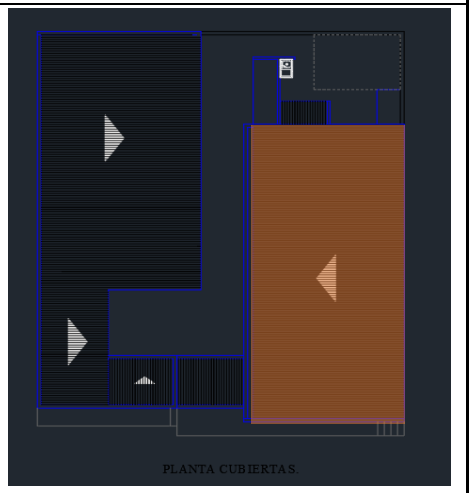

OBSERVACIONES:se hara un cambio total de la cubierta en su estructura y se colocara en teja termoacustica upvc , teneindo en cuenta que la cubierta actual esta se encuentra en malas condiciones y en material de asbesto cemento.

TOTAL: 77,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

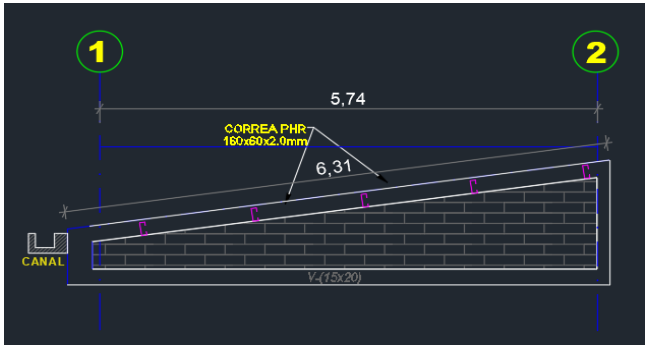

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CUBIERTAS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	CABLE TENSORES 3/8"					
	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
CABLE TENSOR PUESTO DE SALUD	1	24			ML	24	PLANO

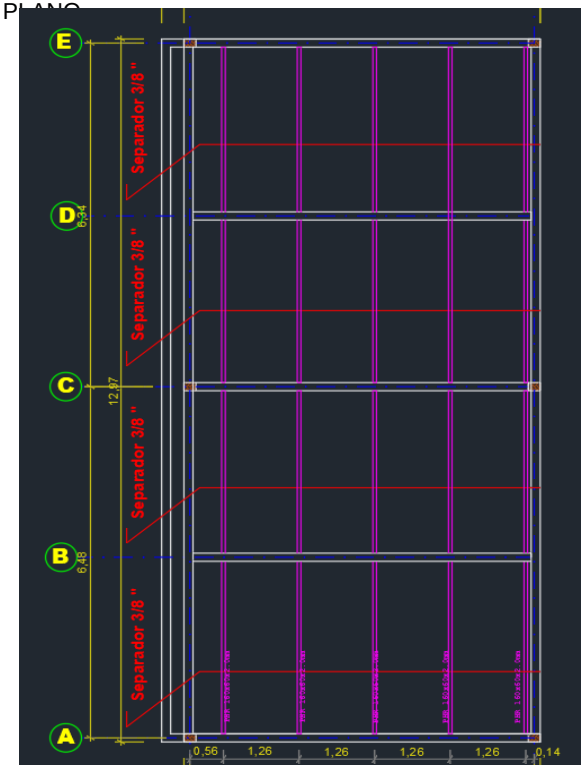

OBSERVACIONES Distribucion de correas de acuerdo a Detalle TIPO para cubiertas de puestos de salud, según concepto tecnico de ingeniero estructural.

TOTAL:	24,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CUBIERTAS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 2O- ANCHO=30 CM					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL 20	1	13			ML	13

ESQUEMA

PLANO

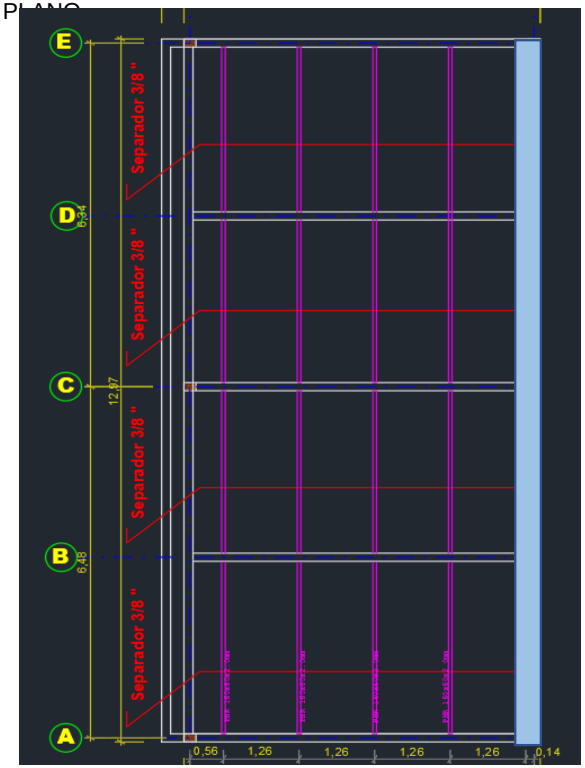

OBSERVACIONES: UBICACIÓN DE FLANCHE ENTRE DILATACION ENTRE MURO Y CUBIERTA PARA EVITAR FILTRACIONES

TOTAL: 13,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO			MEMORIA DE CANTIDADES	
CAPITULO		ENCHAPES Y PISOS	FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION		
UNIDAD	m2	MORTERO DE NIVELACION DE PISO 1:4		

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
MORTERO NIVELACION ODONTOLOGIA	1	4,8	2,9		m2	13,92
mortero nivelacion PISO PATIO	1	10	5,5		M2	55,00

ESQUEMA

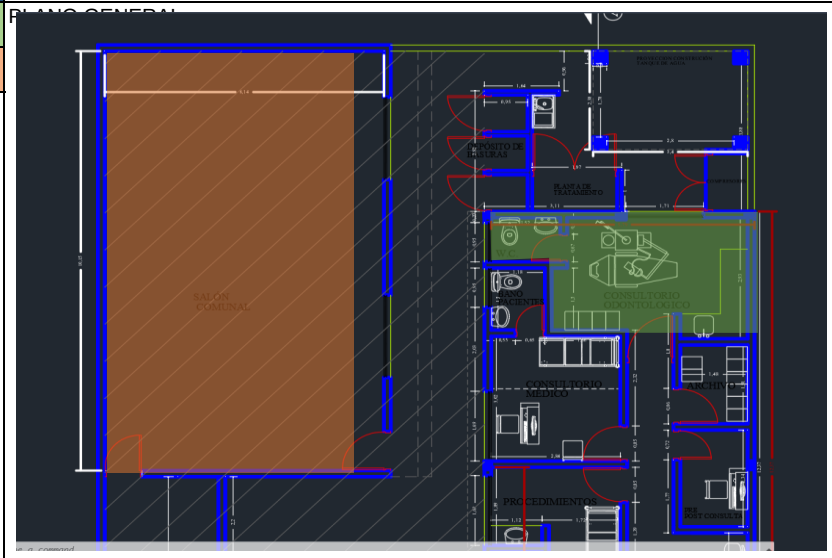

OBSERVACIONES:

TOTAL: 68,92

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		ENCHAPES Y PISOS				FECHA:	
ITEM						DESCRIPCION	
UNIDAD	m2	ENCHAPE PARA PISO CEREMICA TRAFICO 5					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
ENCHAPE piso		4,8	2,9		m2	13,92

ESQUEMA

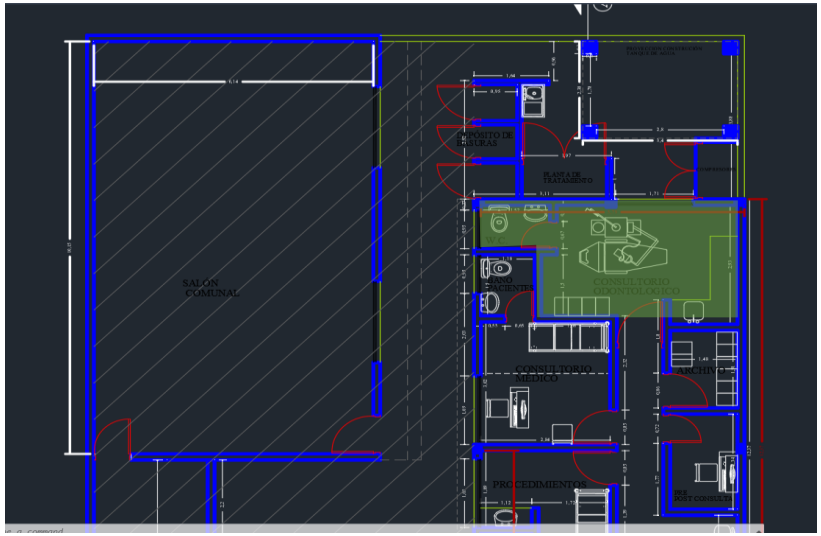

OBSERVACIONES: se realizara un cambio total de enchape de piso de todo el puesto de salud para porporcionar unos acabados modernos que garanticen una estabilidad en la edificacion

TOTAL: 13,92

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		ENCHAPES Y PISOS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	ml	MEDIA CAÑA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO					
	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
media caña odontologia		19			Ml	19	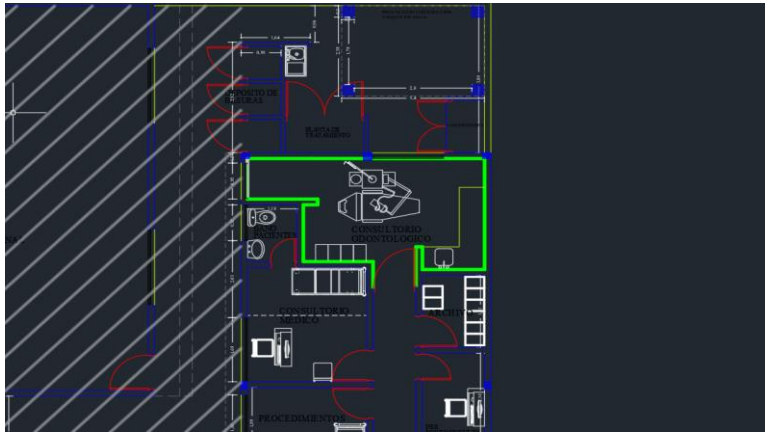
OBSERVACIONES:							
					TOTAL:	19,00	

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		ESTUCO Y PINTURA				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	m2	PINTURA TIPO 1 PARA CIELO RASO PANEL YESO 3 MANOS, INCLUYE RESANE					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
PINTURA CIELO RASO PUESTO DE SALUD	1	8	5		M2	40,00

ESQUEMA

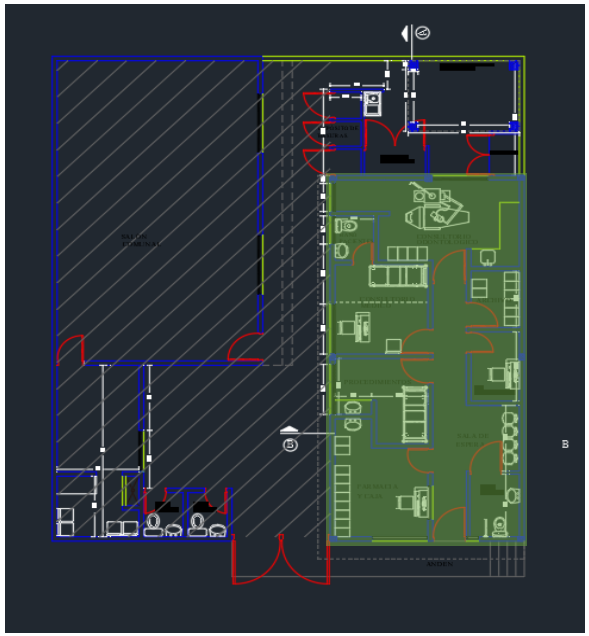

OBSERVACIONES: PINTURA EN CORRECIONES DE CIELO RASO PANEL YESO

TOTAL: 40,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO						MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		ESTUCO Y PINTURA			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	m2	PINTURA PLANA KORAZA PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
CIELO RASO PUESTO DE SALUD	1	17	3,2		m2	54,4

ESQUEMA

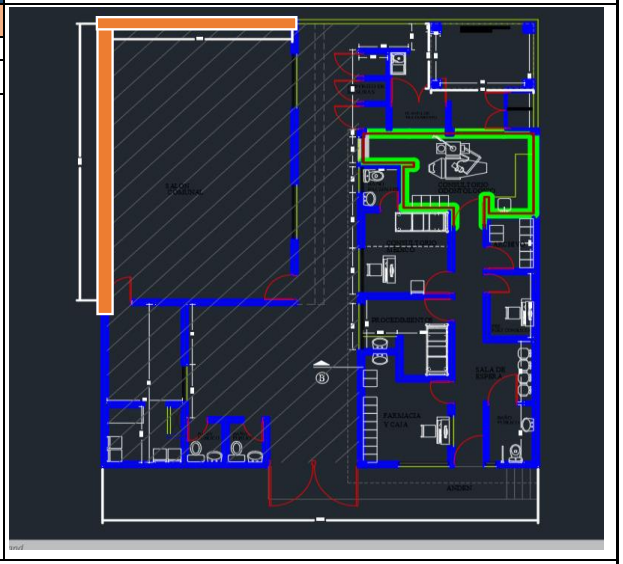

OBSERVACIONES:

TOTAL: 54,40

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO						MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		ESTUCO Y PINTURA			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	m2	PINTURA CON LOGOTIPO KORAZA PARA FACHADA - TRES MANOS INCLUYE RESANE SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA (EMAX = 1CM)				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
CIELO RASO PUESTO DE SALUD	1	14,5	3,2		m2	46,4

ESQUEMA

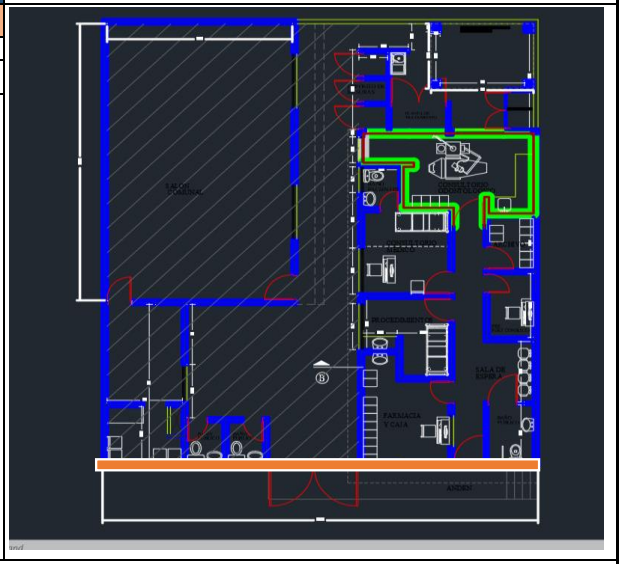

OBSERVACIONES:

TOTAL: 46,40

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO						MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		CIELO RASO			FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION				
UNIDAD	m2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PANEL YESO , SOPORTES METÁLICOS Y PERFORACIONES				

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO		
CIELO RASO PUESTO DE SALUD	1	8	5		m2	40

ESQUEMA

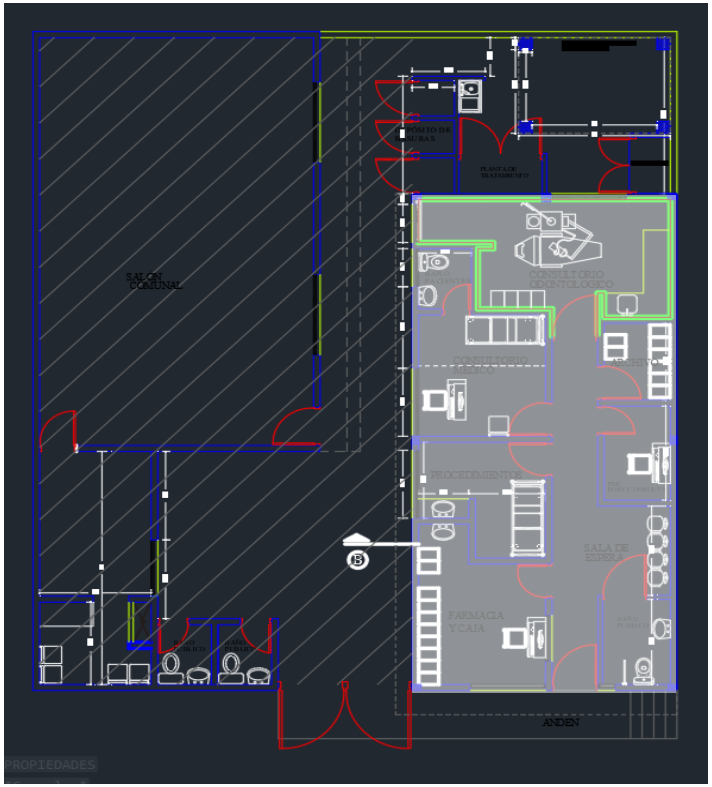

OBSERVACIONES:

TOTAL:	40,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511

ADECUACIONES MENORES DEL PUESTO DE SALUD GUALMATAN - PASTO							MEMORIA DE CANTIDADES
CAPITULO		INSTALACIONES DE REDES ELECTRICAS Y DATOS				FECHA:	
ITEM		DESCRIPCION					
UNIDAD	und	DESMONTE Y REINSTALACION DE LAMPARAS EXISTENTES					

	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO			
consultorio odontologico	6				und	6	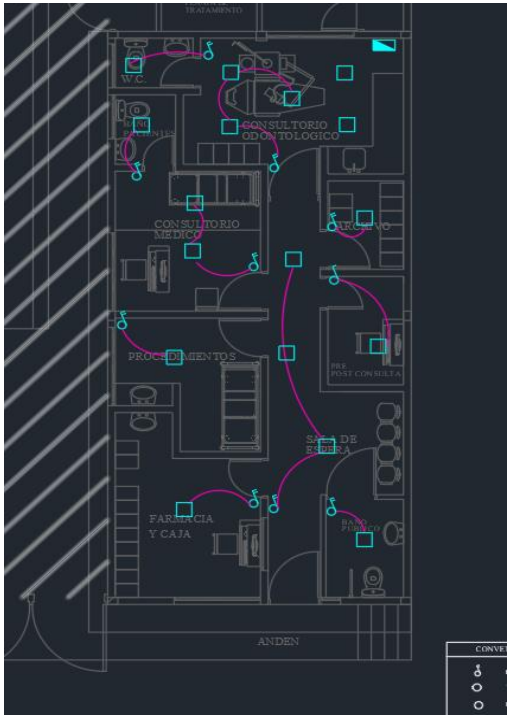
consultorio medico	3				und	3	
archivo	2				und	2	
postconsulta	2				und	2	
farmacia	3				und	3	
enfermeria	3				und	3	
pasillo	3				und	3	
baños	3				und	3	

OBSERVACIONES:

TOTAL: 25,00

ELABORÓ: ARQ. CARLOS FERNANDO ORTEGA
No. M.P A137302016-1085270511
